

- 자체 수원생산 공급지역에(선원, 노구) 수질악화 및 취수량 부족 등으로 지방상수도의 비상사태 시 대처를 위한 비상공급망 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 남해군 고현, 서면 일원
- 사업기간 : 2020.1. ~ 2021.12.(2년간)
- 사업내용 : 상수관로 매설 L=12km, 가압장 3개소
- 총사업비 : 4,286백만 원(도비 3,000, 군비 1,286)
- 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	사 업 비			비 고
		2020년	2021년	2022년이후	
계	4,286	2,857	1,429	-	
도 비	3,000	2,000	1,000	-	
군 비	1,286	857	429	-	

□ 추진상황 및 계획

- 2020. 2. : 실시설계완료
- 2020. 3. : 도로굴착심의 및 점용허가 완료
- 2020. 3. : 사업발주 및 착공(총괄 및 1차분)
- 2020.12. : 사업 1차분 준공
- 2021.12. : 사업완료 예정(총괄 및 2차분)

□ 소요예산 : 1,429백만 원(도비 1,000, 군비 429)


□ 문제점 및 대책

- 특이사항 없음

□ 기대효과

- 노구, 선원 급수구역 비상사태 발생 시 신속한 대처로 주민 불편 최소화 및 안정적인 상수도 공급
- 지방상수도 비상공급망 구축을 통한 상수관망 선진화 선도

□ 위치도

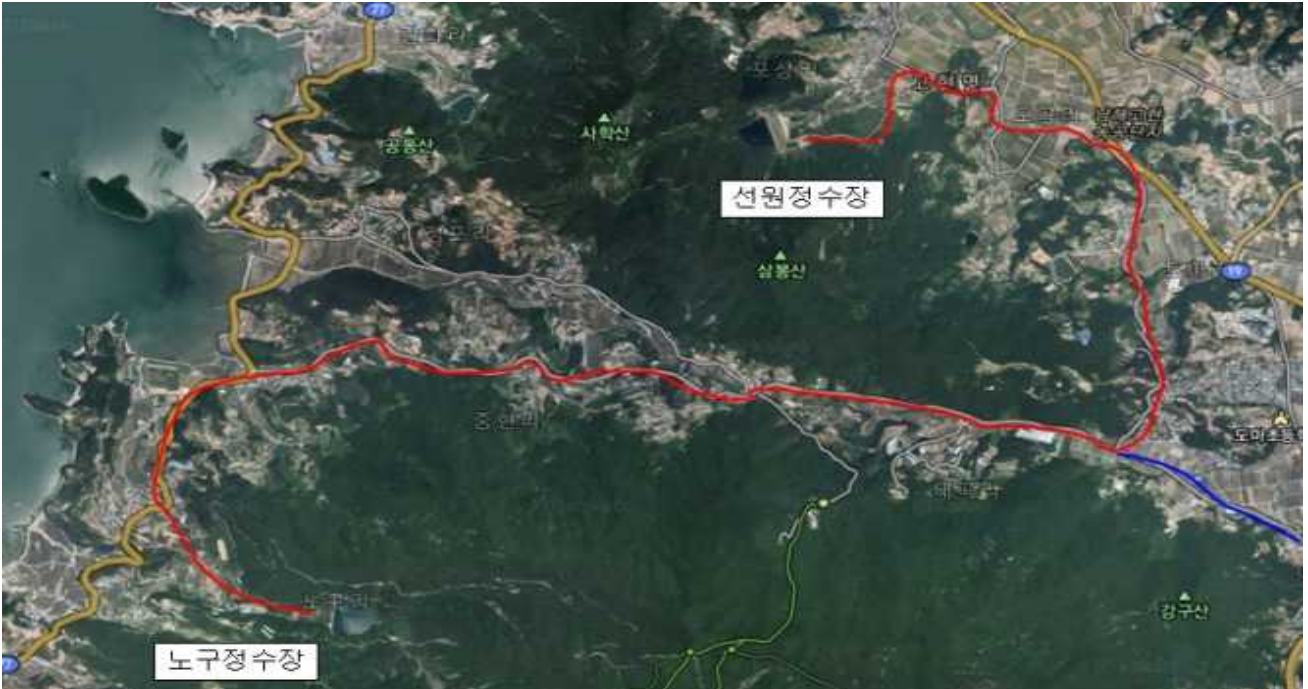

□ 현황사진



부서/팀	상하수도과 / 상수도팀	담당자	시설7급 신동평	전화번호	3324
------	--------------	-----	----------	------	------
